
1       51%       Projekt Dobby       1002 Tage? Mon 04.04.16 Mon 29.05.17         2       52%       App       778,13 Tage Mit 06.04.16 Fre 17.03.17         3       10       Version 1       82,13 Tage Mit 06.04.16 Die 03.05.16         4       10       Informationsbeschafft 20 Tage Mit 06.04.16 Don 14.04.16 Don 14.04.16 Don 14.04.16       101         5       10       Einloggen       1 Tag Fre 15.04.16 Fre 15.04.16 Fre 15.04.16 S         7       10       Menü       4 Tage Mon 18.04.16 Don 21.04.16 S         8       10       Verbinden       2 Tage Fre 22.04.16 Mon 25.04.16 7;39     Marie-Kristin Kai  Marie-Krist	Nr.	0	% Vorga Abges	angsmodus	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Mrz	Qtl, 2016	
3			51% 🔜		Projekt Dobby	1002 Tage?	Mon 04.04.16	Mon 29.05.17		IVIIZ	Apr   Ivial   3	un
3	2		52% 🔜		Арр	778,13 Tage	Mit 06.04.16	Fre 17.03.17				
S   10    Grundgerüst   7 Tage   Mit 06.04.16   Don 14.04.16   101	3	<b>V</b>	10 🔜			82,13 Tage	Mit 06.04.16	Die 03.05.16				
Finloggen   1 Tag	4	<b>V</b>	10 🕶		Informationsbeschaffu	. 20 Tage	Mit 06.04.16	Die 03.05.16	101		Marie-Kristi	n Ka
Menü	5	<b>V</b>	10 🔜		Grundgerüst	7 Tage	Mit 06.04.16	Don 14.04.16	101		Marie-Kristin Kais	er[7
8	6	<b>√</b>	10 🔜		Einloggen	1 Tag	Fre 15.04.16	Fre 15.04.16	5		Marie-Kristin Kais	er[7
Marie-Kristin   Solution   Steuerelemente   Tag   Die 26.04.16   Die 26.04.16   S   Marie-Kristin   Die 27.12.16   Die 27.12.16	7	<b>V</b>	10 🔜		Menü	4 Tage	Mon 18.04.16	Don 21.04.16	6		Marie-Kristin K	aiser
10	8	<b>V</b>	10 =		Verbinden	2 Tage	Fre 22.04.16	Mon 25.04.16	7;39		Marie-Kristin	<b>Caise</b>
11	9	<b>√</b>	10 🔜		Kommunizieren	1 Tag	Die 26.04.16	Die 26.04.16	8		Marie-Kristin	Kais
12	10		43% 🔜		Version 2	463,13 Tage	Mon 03.10.16	Fre 17.03.17				
13	11		50% 🔜		Informationsbeschaffu	.115 Tage	Mon 03.10.16	Fre 10.03.17	9			
14	12	***	80% 🔜		Grundgerüst	14 Tage	Mon 05.12.16	Don 22.12.16	9			
15	13	✓	10 🔜		Verbindung/Kommuni	i3 Tage	Fre 23.12.16	Die 27.12.16	12			
10	14		0% 🔜		Einloggen	3 Tage	Mit 28.12.16	Fre 30.12.16	13			
17	15	<b>V</b>	10 🕶		Konsole [Entwickler]	3 Tage	Mon 02.01.17	Mit 04.01.17	14			
18	16	<b>V</b>	10 🔫		Moduswahl	7 Tage	Don 05.01.17	Fre 13.01.17	15			
Steuerelemente 7,13 Tage Mon 16.01.17 Mit 18.01.17  20 0% Joystick 3 Tage Mon 16.01.17 Mit 18.01.17 16  21 0% App abgeschlossen 0 Tage Fre 17.03.17 Fre 17.03.17 18  22 50% RaspberryPi 673,13 Tage Mon 04.04.16 Mit 08.02.17  Task Inactive Summary External Tasks Split Manual Task External Milestone Ouration-only Deadline Summary Manual Summary Rollup Progress Project Summary Manual Summary Rollup Progress Manual Summary Start-only Cartering Manual Progress Start-only Cartering Mit 18.01.17  Mit 18.01.17  Mit 18.01.17  Deadline  Mit 08.02.17	17		0% 🔜		3D Modell	35 Tage	Don 19.01.17	Mit 08.03.17	20			
Joystick 3 Tage Mon 16.01.17 Mit 18.01.17 16  21 0% App abgeschlossen 0 Tage Fre 17.03.17 Fre 17.03.17 18  22 50% RaspberryPi 673,13 Tage Mon 04.04.16 Mit 08.02.17  Task Inactive Summary External Tasks  Split Manual Task External Milestone  Milestone Summary Manual Summary Rollup Progress  Milestone Summary Manual Summary Rollup Progress  Manual Summary Manual Summary Manual Progress  Manual Progress  Start-only	18		0% 🔜		Kamerabild Anzeige	7 Tage	Don 09.03.17	Fre 17.03.17	17;34			
App abgeschlossen 0 Tage Fre 17.03.17 Fre 17.03.17 18  22 50% RaspberryPi 673,13 Tage Mon 04.04.16 Mit 08.02.17  Task Inactive Summary External Tasks Split Manual Task External Milestone Ouration-only Deadline Summary Manual Summary Rollup Progress Project Summary Manual Summary Manual Summary Manual Progress Inactive Task Start-only	19		0% 🛶		Steuerelemente	7,13 Tage	Mon 16.01.17	Mit 18.01.17				
Project: Simple Project Plan Date: Die 21.02.17  RaspberryPi  RaspberryPi  673,13 Tage Mon 04.04.16 Mit 08.02.17  Inactive Summary  Manual Task  Split  Manual Task  Duration-only  Manual Summary Rollup  Progress  Manual Summary  Inactive Task  Start-only  Start-only	20		0% 🕶		Joystick	3 Tage	Mon 16.01.17	Mit 18.01.17	16			
Project: Simple Project Plan Date: Die 21.02.17  Task  Inactive Summary  Manual Task  Split  Manual Task  External Milestone  Duration-only  Deadline  Frogress  Manual Summary  Manual Summary  Manual Summary  Inactive Task  Start-only	21		0% 🔜		App abgeschlossen	0 Tage	Fre 17.03.17	Fre 17.03.17	18			
Project: Simple Project Plan Date: Die 21.02.17  Split  Manual Task  Duration-only  Manual Summary  Project Summary  Project Summary  Inactive Task  Split  Manual Task  External Milestone  Deadline  Progress  Manual Summary  Manual Summary  Manual Progress	22		50% 🔜		RaspberryPi	673,13 Tage	Mon 04.04.16	Mit 08.02.17				
Project: Simple Project Plan Date: Die 21.02.17  Milestone Summary Project Summary Project Summary Inactive Task  Duration-only Manual Summary Rollup Progress Manual Progress Start-only				Task		Inactive Summa	ary	Exter	nal Tasks			
Project: Simple Project Plan Date: Die 21.02.17  Milestone Summary Project Summary Project Summary Inactive Task  Duration-only Manual Summary Rollup Progress Manual Progress Start-only				Split		Manual Task		Exter	nal Milestone	$\Diamond$		
Project: Simple Project Plan Date: Die 21.02.17  Summary Project Summary Project Summary Manual Summary Manual Summary  Inactive Task  Start-only				Milestone	<b>♦</b>	Duration-only				<b>+</b>		
Project Summary Inactive Task  Start-only  Manual Summary  C	-			Plan		•	ry Rollup					
Inactive Task Start-only	Date: I	Die 2	1.02.17									
					•							
						•						
Page 1												



Nr.	0	% Abges	Vorgangsmod	us	Vorgangsnar	me	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger		2. Qtl, 2016	l	1 .
45	~	10	<b>-</b>		Grund	llagen [Informatior	20 Tage	Mon 04.04.16	Fre 29.04.16		Mrz	Apr	Mai  Daniel S	Jun Stumpf[80
46	<b>V</b>	10			Transo	-		Mon 02.05.16		5				
47	<b>V</b>	10			Ent	wurf	3 Tage	Mon 02.05.16				,	🛓 Danie	Stumpf[8
48	<b>V</b>	10	<b>-</b>		Мо	ntage	1 Tag	Don 05.05.16	Don 05.05.16	6 47			Danie	l Stumpf[
49	<b>V</b>	10	-		Syst	temtest	6 Tage	Fre 06.05.16	Fre 13.05.16	48			Tai	ոiel Stump
50	<b>V</b>	10	-5		Feh	lerbehebung	10 Tage	Fre 06.05.16	Don 19.05.16	6 48			D	aniel Stu
51		84%	4)		Anste	uerung	112,13 Tage	Mon 04.07.16	Mon 24.10.1	6				
52	-	83%	4)		Imp	lementierung	70 Tage	Mon 04.07.16	Fre 07.10.16	50				
53	<b>V</b>	10	-5			egration in das uptprogramm	1 Tag	Mon 10.10.16	Mon 10.10.1	6 52				
54		90%	4		Syst	temtest	10 Tage	Die 11.10.16	Mon 24.10.1	6 53				
55		90%	4		Feh	lerbehebung	6 Tage	Die 11.10.16	Die 18.10.16	53				
56		0%	-		Motor	ren abgeschlossen	0 Tage	Mon 24.10.16	Mon 24.10.1	6 55;54				
57		94%	4		Mechani	ik	532,13 Tage	Mon 04.04.16	Mon 12.12.1	6				
58	<b>V</b>	10	4		Konze	ptionierung	20 Tage	Mon 04.04.16	Fre 29.04.16				Daniel S	Stumpf[10
59	<b>V</b>	10	4		Mater	ialauslegung	40 Tage	Mon 02.05.16	Fre 24.06.16	58				
60	<b>V</b>	10	4)		Monta	age	259,13 Tage	Mon 27.06.16	Mon 05.12.1	6				
61	<b>V</b>	10	4		Ant	riebsstrang	2 Tage	Mit 29.06.16	Don 30.06.16	63				
62	<b>V</b>	10			Hol	zverkleidung	2 Tage	Fre 01.07.16	Mon 04.07.1	6 61				
63	<b>V</b>	10	-		Cha	issis	2 Tage	Mon 27.06.16	Die 28.06.16	59				
64	<b>V</b>	10	4		Sen	sor	2 Tage	Die 05.07.16	Mit 06.07.16	62				
65	<b>V</b>	10	<b>-</b> 5		Ras	pberryPi	2 Tage	Mon 11.07.16	Die 12.07.16	66				
				Task			Inactive Summa	ary [	Ext	ernal Tasks				
				Split			Manual Task		Ext	ernal Milestone	$\Diamond$			
				Milestone		<b>♦</b>	Duration-only		Dea	adline	•			
		•	ject Plan	Summary			Manual Summa	ary Rollup	Pro	gress				
Date:	Die 2	1.02.17		Project Sum	mary		Manual Summa			nual Progress				
				Inactive Task	•		Start-only	E		J				
				Inactive Mile		$\Diamond$	Finish-only	3						
							Pac	ge 3						

Nr.		% Vorgangs	smodus	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger				
	0	Abges							Mrz	2. Qtl, 2016 Apr	6 Mai	Jun
66	<b>V</b>	10 🕶		Kamera	2 Tage	Don 07.07.16	Fre 08.07.16	64	17112	T / (pi		Jun
67	<b>V</b>	10		Akkus	5 Tage	Die 29.11.16	Mon 05.12.16	65				
68		50% 🔜		Fehlerbehebung	5 Tage	Die 06.12.16	Mon 12.12.16	67				
69		50% 🔜		Systemtest	5 Tage	Die 06.12.16	Mon 12.12.16	67				
70		89% 🔜		Elektronik	532,13 Tage	Mon 04.04.16	Mon 12.12.10	6				
71	<b>V</b>	10 🔜		Konzeptionierung	20 Tage	Mon 04.04.16	Fre 29.04.16				Daniel S	tumpf[1
72		95% 🔜		Materialauslegung	40 Tage	Mon 02.05.16	Fre 24.06.16	71				
73		99% 🔜		Montage	25,13 Tage	Mon 27.06.16	Die 05.07.16					
74	<b>V</b>	10 🕶		Reihenklemmen	1 Tag	Mon 27.06.16	Mon 27.06.16	5 72				`
75		95% 🔜		Verdrahtung	2 Tage	Die 28.06.16	Mit 29.06.16	74				
76	<b>V</b>	10 🕶		Steckermontage	1 Tag	Don 30.06.16	Don 30.06.16	75				
77	<b>V</b>	10 🕶		Ladegerät	3 Tage	Fre 01.07.16	Die 05.07.16	76				
78		40% 🔜		Systemtest	5 Tage	Die 06.12.16	Mon 12.12.16	5 77				
79		40% 🔜		Fehlerbehebung	5 Tage	Die 06.12.16	Mon 12.12.16	5 77				
80		0% 🔜		Kontrolle	490,13 Tage	Die 25.10.16	Mon 17.04.1	7				
81		0% 🔜		Testen	304,13 Tage	Mon 02.01.17	Don 13.04.17	,				
82		0% 🕶		Арр	238,13 Tage	Mon 02.01.17	Mit 22.03.17					
83		0% 🕶		Cucumber	52 Tage	Mon 02.01.17	Die 14.03.17	14				
84		0% 🕶		Monkey	3 Tage	Mon 20.03.17	Mit 22.03.17	21				
85		0% 🕶		Unit Test	52 Tage	Mon 02.01.17	Die 14.03.17	14				
86		0% 🛂		Testszenarien (Tauglichkeit)	10 Tage	Fre 31.03.17	Don 13.04.17	90				
			Task		Inactive Summa	ary	Exte	ernal Tasks				
			Split		Manual Task		Exte	ernal Milestone	$\Diamond$			
	. 6:		Milestone	<b>♦</b>	Duration-only		Dea	dline	•			
•		ple Project Plan 1.02.17	Summary		Manual Summa	ary Rollup	Pro	gress				
Date.	DIC Z	1.04.11	Project Sum	nmary	Manual Summa	ary 🗀		nual Progress				
			Inactive Tas	k	Start-only	Е						
			Inactive Mile	estone $\Diamond$	Finish-only	3						
			1		Pac	ge 4						

Nr.		Vorgangsmoo	dus	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger				
0	Abges									2. Qtl, 2016		1 .
87	0%	<b>-</b>		Systemtest	5 Tage	Mon 20.03.17	Fre 24.03.17	21;43;56	Mrz	Apr	Mai	Jun
88	0%	-5		RaspberryPi	10 Tage	Don 09.02.17	Mit 22.02.17					
89	0%			Prüfen	-	Die 25.10.16	Don 30.03.17					
90	0%	4		Geschwindigkeitsprü		Mit 29.03.17	Don 30.03.17					
91	0%	4		Belastungsprüfung	1 Tag	Die 06.12.16	Die 06.12.16	67				
92	0%	<b>-</b> 5		Stromprüfung	2 Tage	Mon 27.03.17	Die 28.03.17	87				
93	0%	-		Spannungsprüfung	2 Tage	Mon 27.03.17	Die 28.03.17	87				
94	0%	-		Sensorprüfung	1 Tag	Don 09.02.17	Don 09.02.17	43				
95	0%	-		Frame-Prüfung	2 Tage	Die 25.10.16	Mit 26.10.16	56				
96	0%	4		Messen	361,13 Tage	Mit 07.12.16	Mon 17.04.1	7				
97	0%	-5		Terrainunterschiede	3 Tage	Fre 14.04.17	Mon 17.04.1	7 86				
98	0%	4		Sensorgenauigkeit	2 Tage	Fre 10.02.17	Mon 13.02.1	7 94				
99	0%			Belastungsmessung	3 Tage	Mit 07.12.16	Fre 09.12.16	91				
100	12%	<b>-</b> 5		Dokumentation	1002 Tage?	Mon 04.04.16	Mon 29.05.1	7				
101	10	<b>-</b> 5		Logo	2 Tage	Mon 04.04.16	Die 05.04.16			Marie-	Cristin Ka	iser[809
102	10%	<b>-</b> 5		Schriftliche Ausarbeitu	ng 90 Tage	Die 27.12.16	Fre 28.04.17	101				
103	10	*		Zwischenstand	0 Tage	Die 10.01.17	Die 10.01.17					
104	0%	*		Projektabschluss	0 Tage	Sam 15.04.17	Sam 15.04.17	7				
105	0%	*		Abgabe Studienarbeit	0 Tage	Mon 15.05.17	Mon 15.05.1	7				
106	0%	*		Notenabgabe Studiena	rk O Tage	Mon 29.05.17	Mon 29.05.1	7				
			Task		Inactive Summ	ary	Ext	ernal Tasks				
			Split		Manual Task		Ext	ernal Milestone	$\Diamond$			
<b>D</b>			Milestone	<b>♦</b>	Duration-only		Dea	adline	•			
Project: Sin Date: Die 2	•	•	Summary		Manual Summa	ary Rollup	Pro	gress				
Date. Die 1	∠ 1.U∠. I <i>I</i>		Project Sur	mmary	Manual Summa			nual Progress				
			Inactive Ta	•	Start-only	Ē		-				
			Inactive M		Finish-only	3						
					Do	ge 5						

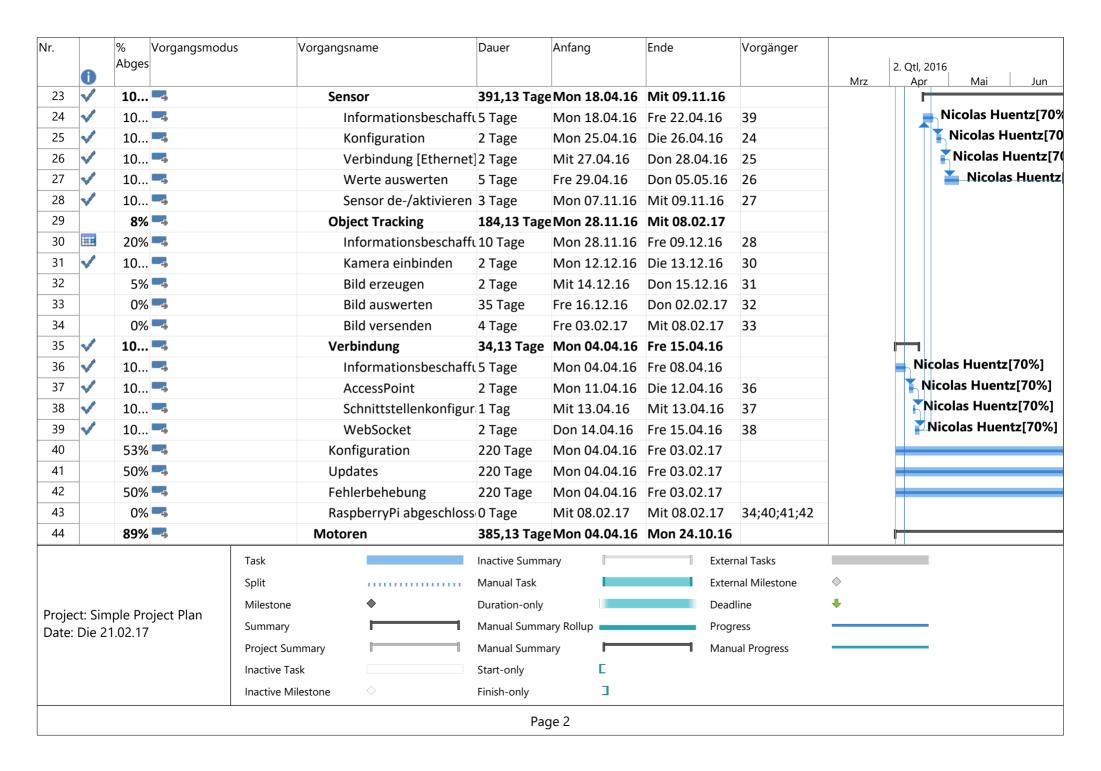
