

Nr.	0	% Vo Abges	rgangsmodus	V	organgsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Mrz	2. Qtl, 2016	Ma:	
1		67% =	<b>,</b>	P	rojekt Dobby	1002 Tage	? Mon 04.04.16	Mon 29.05.1	7	IVITZ	Apr	Mai	Jun
2		80% 🔜	,		Арр		ge Mit 06.04.16						
3	<b>✓</b>	10 🔜	,		Version 1	82,13 Tag	e Mit 06.04.16	Die 03.05.16				1	
10		76% 🔜	,		Version 2	463,13 Ta	ge Mon 03.10.16	Fre 17.03.17					
11	<b></b>	85% 📑	,		Informationsbeso	chafft 115 Tage	Mon 03.10.16	Fre 10.03.17	9				
12	<b>===</b>	95% 📑	,		Grundgerüst	14 Tage	Mon 05.12.16	Don 22.12.16	9				
13	<b>✓</b>	10 📑	,		Verbindung/Kom	muni 3 Tage	Fre 23.12.16	Die 27.12.16	12				
14	<b>✓</b>	10 🔜	,		Einloggen	3 Tage	Mit 28.12.16	Fre 30.12.16	13				
15	<b>✓</b>	10			Konsole [Entwick	ler] 3 Tage	Mon 02.01.17	Mit 04.01.17	14				
16	<b>✓</b>	10 🕶	}		Moduswahl	7 Tage	Don 05.01.17	Fre 13.01.17	15				
17		25% 🔜	,		3D Modell	35 Tage	Don 19.01.17	Mit 08.03.17	20				
18		75% 🔜			Kamerabild Anze	ige 7 Tage	Don 09.03.17	Fre 17.03.17	17;34				
19	<b>✓</b>	10 🔜			Steuerelemente	7,13 Tage	Mon 16.01.17	Mit 18.01.17					
21		0% 🔤			App abgeschlossen	0 Tage	Fre 17.03.17	Fre 17.03.17	18				
22		71% 🔤			RaspberryPi	673,13 Ta	ge Mon 04.04.16	Mit 08.02.17					
23	<b>✓</b>	10 🔜	,		Sensor	391,13 Ta	ge Mon 18.04.16	Mit 09.11.16					
29		62% 🔜	,		<b>Object Tracking</b>	184,13 Ta	ge Mon 28.11.16	Mit 08.02.17					
30	<b>===</b>	75% 🔜	,		Informationsbeso	chaffi 10 Tage	Mon 28.11.16	Fre 09.12.16	28				
31	<b>✓</b>	10 🔜			Kamera einbinde	n 2 Tage	Mon 12.12.16	Die 13.12.16	30				
32	<b>✓</b>	10 🔜	,		Bild erzeugen	2 Tage	Mit 14.12.16	Don 15.12.16	31				
33		50% 📑	,		Bild auswerten	35 Tage	Fre 16.12.16	Don 02.02.17	32				
34	<b>✓</b>	10 🕶			Bild versenden	4 Tage	Fre 03.02.17	Mit 08.02.17	33				
				Task		Inactive Sum	mary	Exte	ernal Tasks				
				Split		Manual Task		Exte	ernal Milestone	$\Diamond$			
	Project: Simple Project Plan Date: Die 28.03.17		Milestone	lestone •		Duration-only		Deadline					
•			Summary		Manual Sum	Manual Summary Rollup Progress							
Date. I						Manual Summary		Manual Progress					
				Inactive Task	•	Start-only	Ē		-				
				Inactive Miles		Finish-only	3						
						P	age 1						



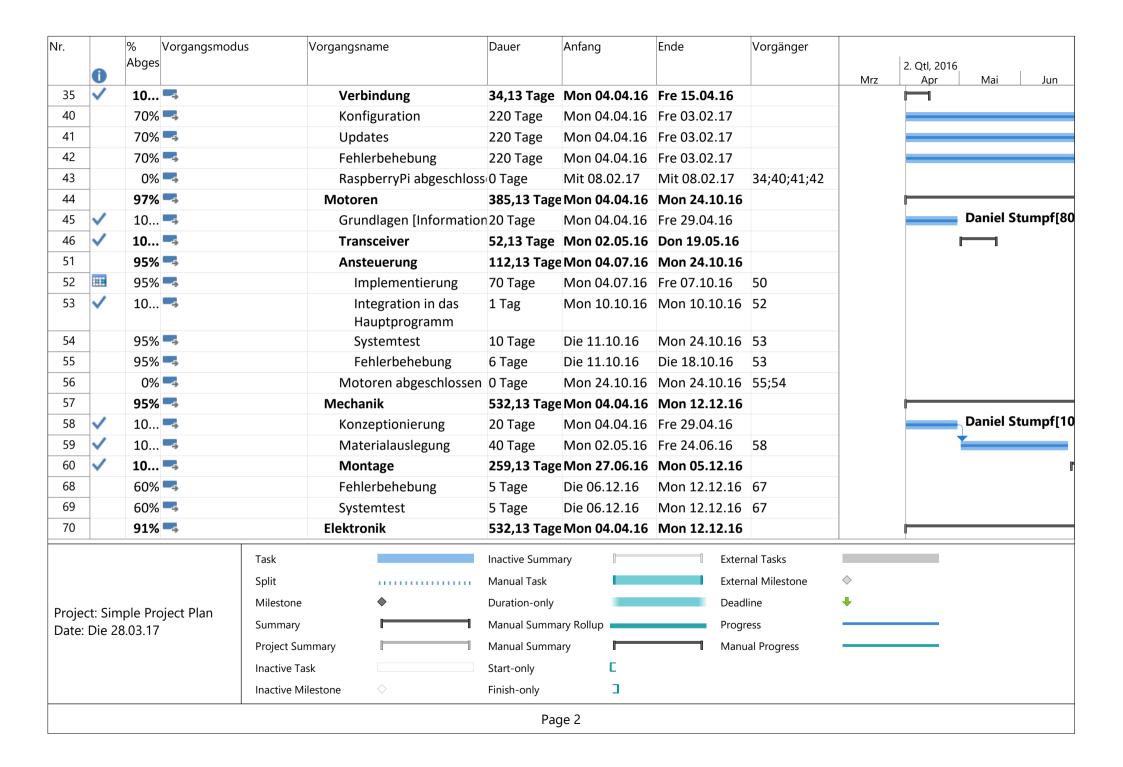

۱r.			Vorgangsmodus	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger		I		
	0	Abges							Mrz	2. Qtl, 2016 Apr	Mai	Jun
92		10%		Stromprüfung	2 Tage	Mon 27.03.17	Die 28.03.17	87	14112	7 (5)	IVIGI	3411
93		10%	-3	Spannungsprüfung	2 Tage	Mon 27.03.17	Die 28.03.17	87				
94		5%	-3	Sensorprüfung	1 Tag	Don 09.02.17	Don 09.02.17	43				
95	<b>~</b>	10	-5	Frame-Prüfung	2 Tage	Die 25.10.16	Mit 26.10.16	56				
96		0% 🔜		Messen	361,13 Tage Mit 07.12.16		Mon 17.04.17					
97		0%	<b>-</b> 5	Terrainunterschiede	3 Tage	Fre 14.04.17	Mon 17.04.17	86				
98		0%	<b>-</b> 5	Sensorgenauigkeit	2 Tage	Fre 10.02.17	Mon 13.02.17	94				
99		0%	<b>-</b> 5	Belastungsmessung	3 Tage	Mit 07.12.16	Fre 09.12.16	91				
100		23%	<b>-</b> 5	Dokumentation	1002 Tage?	Mon 04.04.16	Mon 29.05.17					
101	<b>~</b>	10	-5	Logo	2 Tage	Mon 04.04.16	Die 05.04.16			Marie-k	Kristin Kai	iser[80%
102		21%	<b>-</b> 5	Schriftliche Ausarbeitung	90 Tage	Die 27.12.16	Fre 28.04.17	101				
103	<b>~</b>	10	*	Zwischenstand	0 Tage	Die 10.01.17	Die 10.01.17					
104	<b>~</b>	10	*	Status-Quo	0 Tage	Die 28.03.17	Die 28.03.17					
105		0%	*	Projektabschluss	0 Tage	Sam 15.04.17	Sam 15.04.17					
106		0%	*	Abgabe Studienarbeit	0 Tage	Mon 15.05.17	Mon 15.05.17					
107		0%	*	Notenabgabe Studienark	0 Tage	Mon 29.05.17	Mon 29.05.17					

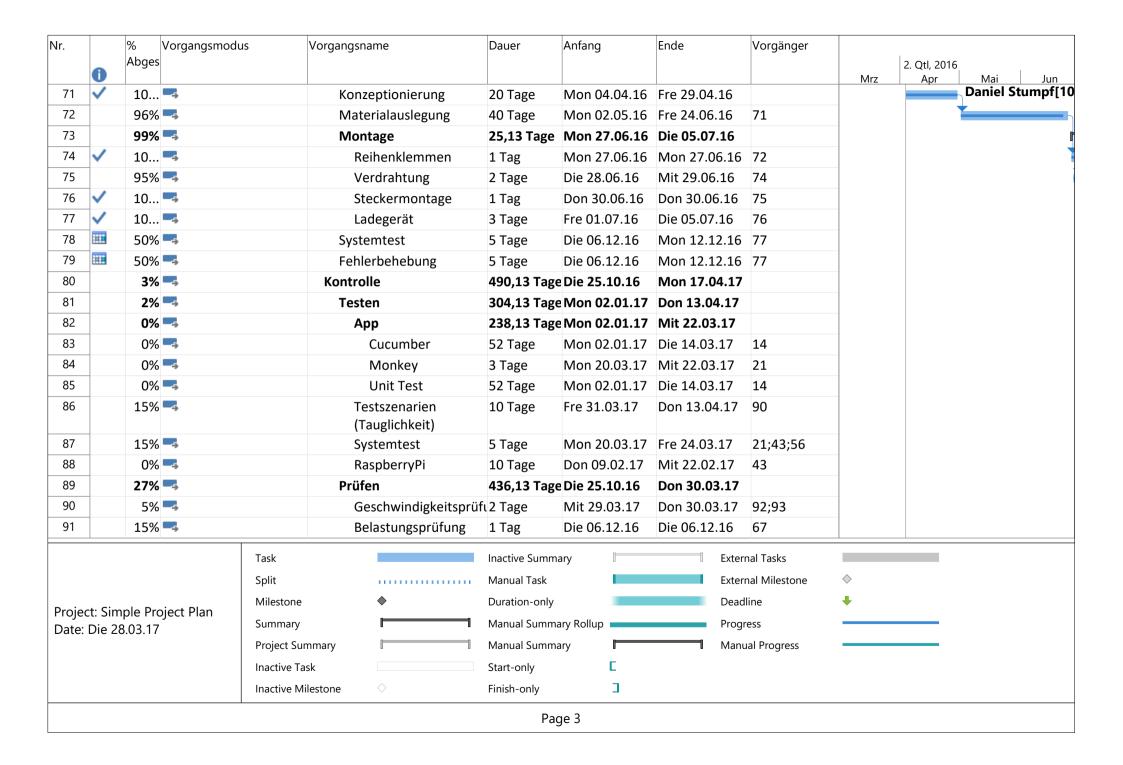
